



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

PROJET N°001/JAF/CODEFO/2012 :

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU CETIC DE FOTOUNI DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BANDJA.

**Douala :**  
**99707334**

**Yaoundé :**  
**75227459**

**Ouest :**  
**99935442**

**FOTOUNI :**  
**77150244**

**Diaspora :**  
**00436648187498**

## RAPPORT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX N°03 DU 25 AOÛT 2012

L'an deux mil douze et vingt cinquième jour du mois d'août, s'établi le troisième rapport d'avancement des travaux du projet cité en titre. Les points ci-après meublent le présent document :

- I- Les contributions;
- II- Les matériaux ;
- III- Le bilan des dépenses;
- IV- L'avancement des travaux ;
- V- Les prévisions des travaux ;
- VI- Les observations et recommandations ;
- VII- Les illustrations photographiques ;
- VIII- Les divers ;
- IX- Les annexes.

### I- LES CONTRIBUTIONS

Nombreux sont les frères, les sœurs, les sympathisants et les groupes organisés du village Fotouni, qui ont déjà apporté leurs modestes contributions à ce projet. A ce jour, le montant total cotisé se situerait autour de 5 000 000 FCFA (Cinq millions de francs). La liste des contributions qui correspondra aux relevés bancaires du compte N° 37330630600648630, intitulé *Jeunesse Fotouni du Cameroun, ouvert à la microfinance C4ED (Caisse Centrale d'Epargne et de Crédit Coopératif du Cameroun)*, vous sera communiquée dans les tous prochains jours.



# Jeunesse Active FOTOUNI

*Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé*

## II- LES MATERIAUX

### II-1- Achetés

Les achats relatifs aux différentes commandes des matériaux ont été effectués à Bafang, de manière séquentielle, suivant les besoins du chantier et en fonction des moyens disponibles. L'état détaillé des achats est présenté dans le point sur le bilan des dépenses.

### II-2- En stock

- **Sable**

Trois camions de sable et demi sont disponibles sur le chantier.

- **Gravier**

Le second camion de graviers 5/15 du précédent achat restant est consommé à 90%. La prochaine commande sera effectuée ces jours.

- **Ciment**

Quarante (40) sacs de ciment sont disponibles au magasin du chantier. Ils serviront au démarrage du coulage des poteaux d'élévation donc les coffrages débuteront le lundi 27 août 2012.

- **Fers**

Tous les poteaux d'élévation soient vingt quatre (24) au total, sont façonnés et stockés sur le chantier pour attendre leur mise en œuvre. Au magasin, on dénombre:

- 15 barres de fers de 10 ;
- 15 barres de fers de 8 ;
- 02 rouleaux de fil d'attache.

**Douala :**  
**99707334**

**Yaoundé :**  
**75227459**

**Ouest :**  
**99935442**

**FOTOUNI :**  
**77150244**

**Diaspora :**  
**00436648187498**



# Jeunesse Active FOTOUNI

*Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé*

- **Bois**

Une bonne partie du bois notamment les lattes ont été sciées sur le chantier grâce au geste louable d'un Jafiste en la personne de M. Dassie Augustin, qui a donné le nécessaire pour accomplir cette tâche. Seules les planches de coffrage ont été achetées à Bafang. Cependant elle reste encore très insuffisante pour la suite des travaux qui sera constituée essentiellement du coffrage. Six coffres des poteaux sont fabriqués et une plate forme pour le coffrage des nervures est déjà aménagée afin recevoir en préfabrication, ces éléments aussi indispensables pour le coffrage de la dalle.

## II-3- A la commande

Pour l'instant, je n'ai reçu de commande formelle à l'édition du présent rapport, cependant, celle en préparation sera forte car, elle doit être constituée essentiellement des matériaux tels que fers, ciment et gravier sans toutefois oublier le bois. D'autant plus que les travaux qui vont reprendre seront du coffrage, du ferrailage et de la mise en œuvre du béton.

## III- BILAN DES DEPENSES

### III-1- TRANSFERTS

Tableau N°1 : Bilan des transferts effectués pour la période du présent rapport.

TRANSFERTS		
DATE	DESIGNATION	MONTANT
18/06/2012	Transfert N°5	300 000
05/07/2012	Transfert N°6 venu de Kousseri	500 000
13/07/2012	Transfert N°7	500 000
TOTAL TRANSFERT DE LA PERIODE		1 300 000

**Douala :**  
**99707334**

**Yaoundé :**  
**75227459**

**Ouest :**  
**99935442**

**FOTOUNI :**  
**77150244**

**Diaspora :**  
**00436648187498**



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

**Tableau N°2 : Bilan des transferts déjà effectués :**

TRANSFERTS		
DATE	DESIGNATION	MONTANT
25/06/2012	TOTAL TRANSFERT PRECEDENT	2 610 000
25/08/2012	TOTAL TRANSFERT DE LA PERIODE	1 300 000
<b>TOTAL TRANSFERT AU 25 AOUT 2012</b>		<b>3 910 000</b>

**Douala :**  
**99707334**

**Yaoundé :**  
**75227459**

**Ouest :**  
**99935442**

**FOTOUNI :**  
**77150244**

**Diaspora :**  
**00436648187498**

## III-2- ACHATS

**Tableau N°3: Bilan des achats de la période du présent rapport :**

ACHATS MATERIAUX ET MATERIELS						
DATE	DESIGNATION	U	QTE	P.U	MONTANT	OBSERVATIONS
13/07/2012	ciment	u	50	5 000	250 000	Quincaillerie Royale Bafang
	Fer de 10	u	50	4 000	200 000	
	Fer de 8	u	20	2 700	54 000	
	Fer de 6	u	30	1 500	45 000	
	Transport	ff	1	10 000	10 000	
20/07/2012	Fer de 10	u	50	4 000	200 000	Quincaillerie Royale Bafang
	Fer de 8	u	20	2 800	56 000	
	Fer de 6	u	30	1 500	45 000	
	Transport	ff	1	10 000	10 000	
21/07/2012	Sable camion 20T	u	3	60 000	180 000	
23/07/2012	Planches de coffrage de 30 x 5m	u	52	3 300	171 600	Ets TILONG Samuel Bafang
	Planches de coffrage de 20 x 4m	u	18	2 500	45 000	
	Transport	ff	1	10 000	10 000	
25/07/2012	ciment	u	50	5 000	250 000	Quincaillerie Royale Bafang
	Transport	ff	1	10 000	10 000	
<b>TOTAL ACHAT DE LA PERIODE</b>					<b>1 536 600</b>	



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

## III-3- MAIN D'ŒUVRE

**Tableau N°4: Main d'œuvre de la période du présent rapport :**

MAIN D'ŒUVRE						
	Paye du 14/06 au 29/06 2012	u	1	173 300	173 300	Voir détails ci-joints
	Paye du chef de chantier	u	1	100 000	100 000	
	Remblai et terrassement	u	1	250 000	250 000	
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE DE LA PERIODE</b>					<b>523 300</b>	

**Douala :**  
99707334

**Yaoundé :**  
75227459

**Ouest :**  
99935442

**Tableau N°5 : Bilan des achats et main d'œuvre déjà effectués :**

ACHATS & MAIN D'ŒUVRE		
DATE	DESIGNATION	MONTANT
25/06/2012	TOTAL ACHATS PRECEDENTS	2 192 100
	TOTAL MAIN D'ŒUVRE PRECEDENTE	350 000
25/08/2012	TOTAL ACHATS DE LA PERIODE	1 536 600
	TOTAL MAIN D'ŒUVRE DE LA PERIODE	523 300
<b>TOTAL ACHATS &amp; MAIN D'ŒUVRE AU 25 AOUT 2012</b>		<b>4 602 000</b>

**FOTOUNI :**  
77150244

**Diaspora :**  
00436648187498

### Remarque :

- 1- Il est trivial que la somme dépensée à ce jour est supérieure au montant de l'ensemble des transferts effectués en direction du village. Le montant supplémentaire y correspondant a été engagé par Sa Majesté.
- 2- Le contrat du chef de chantier a été arrêté à 350 000 F pour l'ensemble des travaux de gros œuvre à savoir, fondation, élévation et dalle. Somme sur laquelle une avance de 100 000 F lui a été remise pour son service bien rendu à ce jour.



# Jeunesse Active FOTOUNI

*Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé*

**Douala :**  
**99707334**

**Yaoundé :**  
**75227459**

**Ouest :**  
**99935442**

**FOTOUNI :**  
**77150244**

**Diaspora :**  
**00436648187498**

- 3- Les pièces justificatives des achats et les états de main d'œuvre payée sur le chantier qui sont déjà parvenues à la rédaction du présent rapport sont jointes en annexe. D'autres par contre sont encore attendues.

#### **IV- AVANCEMENT DES TRAVAUX**

Cette période a été marquée par la réalisation complète des fondations devant abriter les deux salles de classes.

Après la construction de l'ensemble des amorces de poteaux et du coulage complet des longrines, les travaux ont été interrompus pour des raisons de remblais des fondations afin de permettre une poursuite judicieuse des prestations.

Des négociations entreprises au près de la Commune d'Arrondissement de Bandja, nous ont permises d'acquérir les services d'une pelle chargeuse qui en un coup, nous a fait deux opérations importantes à savoir : le remblai des fondations et le terrassement de la zone qui abritera les deux prochaines salles de classe en vue d'asseoir définitivement le rez de chaussée de notre bâtiment.

A ce jour, le taux d'avancement global des travaux est estimé à 30% de réalisation.

#### **V- PREVISIONS DES TRAVAUX**

Les matériaux disponibles sur le chantier vont permettre une reprise des travaux. Sous réserve de l'achat de la commande des matériaux en préparation, les travaux ci-après sont au programme :

- Coffrage et coulage des poteaux ;
- Démarrage du coffrage et coulage des poutres ;
- Démarrage de la préfabrication des nervures ;
- Démarrage de la fabrication des hourdis ou corps creux ;
- Démarrage de la fabrication des parpaings ;
- Etc...



# Jeunesse Active FOTOUNI

*Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé*

## VI-OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

En plein dans la saison des pluies, les travaux vont se poursuivre malgré les intempéries ; d'autant plus que les travaux en fondation sont achevés.

Il faut avouer que la qualité des travaux réalisés jusqu'ici est très satisfaisante, nous prions vivement l'équipe sur le chantier de poursuivre dans cette lancée.

Pendant que les coffreurs vont mettre en œuvre les poteaux d'élévation après avoir disposé les armatures, une équipe sera chargée de faire la préfabrication des nervures, tandis que l'autre s'occupera de produire les hourdis ou corps creux. Après suivra le ferrailage et le coffrage des poutres ainsi que de la dalle.

Il est clair que la tâche ne sera pas facile, compte tenu du fait qu'on aborde ici une phase déterminante dans la réalisation de ces travaux, mais sachant compter sur notre détermination et notre dynamisme, suis certain qu'on va y arriver. Une fois que les matériaux de la commande en préparation seront achetés, il ne restera plus que leurs mises en œuvre dans le respect des conditions technologiques et suivant les règles de l'art.

Je ne saurais clore ce présent rapport sans renouveler mon invitation à tous nos frères et sœurs et sympathisants du groupement Fotouni, qui trainent encore avec leurs contributions, à se mobiliser massivement pour la réalisation de ce projet qui pour nous, est loin d'être seulement un CETIC mais un LYCEE TECHNIQUE au moins, une fois l'achèvement complète des travaux du présent bâtiment.

Que ceux qui ont déjà fait un geste jusqu'ici soit béni par l'Eternel des Armés, qu'il les accorde d'avantage afin qu'ils puissent faire un effort supplémentaire pour le développement de notre groupement FOTOUNI.

**Douala :**  
**99707334**

**Yaoundé :**  
**75227459**

**Ouest :**  
**99935442**

**FOTOUNI :**  
**77150244**

**Diaspora :**  
**00436648187498**



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

## VII- ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

**Douala :**  
99707334

**Yaoundé :**  
75227459

**Ouest :**

99935442

**FOTOUNI :**  
77150244

**Diaspora :**

00436648187498



Mise en œuvre des longrines intermédiaires sur pilotis



Maçonnerie des murs extérieurs de soubassement et chainage



Terrassement et mise en remblais des fondations



Apport des matériaux pour remblais des fondations



Remblais complets des fondations



Aménagement de la rampe d'accès sur le chantier





# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

**Douala :**  
99707334

**Yaoundé :**  
75227459

**Ouest :**  
99935442

**FOTOUNI :**  
77150244

**Diaspora :**  
00436648187498



Poteaux façonnés en attente de la mise en œuvre



Coffres pour poteaux façonnés en attente



Plate forme pour coulage des nervures



Terrassement du prochain site des salles de classe

## VIII- DIVERS

La suite dans le prochain numéro.

Fait à Douala, le 25 août 2012.

**Daladiou Jean Paul TCHAMBA**

Ingénieur /Master du Génie Civil

Responsable du suivi des travaux

[iptchano@yahoo.fr](mailto:iptchano@yahoo.fr)

Tel: 00 237 22194933 / 76838403 / 96268997

J.A.F de YAOUNDE



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :  
99707334


Yaoundé :  
75227459

Ouest :  
99935442

FOTOUNI :  
77150244

Diaspora :  
00436648187498

## IX- ANNEXES

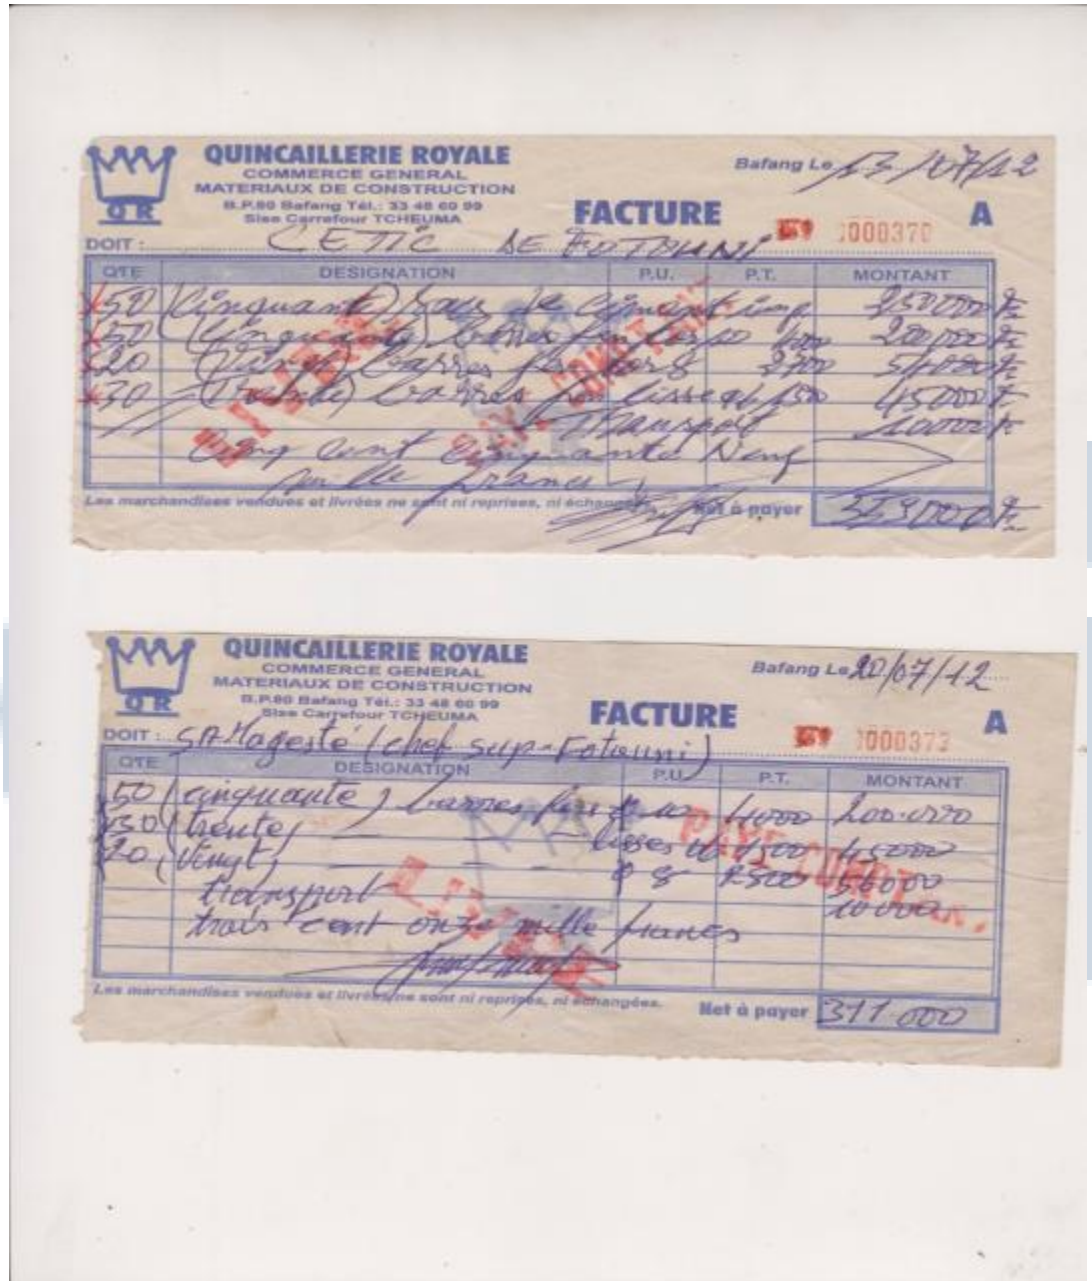



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

**Douala :**  
99707334

**Yaoundé :**  
75227459

**Ouest :**

99935442

**FOTOUNI :**  
77150244

**Diaspora :**  
00436648187498

**ET'S. TILONG SANUEL**  
VENTE DE BOIS D'OEUVRE  
A COTE P.N.C. BAFANG

**FACTURE** Date: 23/7/2012  
N° 0001055

M., Mme, Mlle

DESIGNATION	QUANTITE	P.U.	P.T.
52 planches boisage 5m x 20		33001-	1716001-
18 planches boisage 4m x 20		25001-	450001-
} dix mille six cent			
<b>TOTAL</b>			2166001-

Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées  
Accrédité la présente facture à la somme de :  
Signature du client  
Signature du vendeur

**QUINCAILLERIE ROYALE**  
COMMERCE GENERAL - MATERIAUX DE CONSTRUCTION  
B.P. 80 BAFANG TEL : 33 48 60 99

**FACTURE** Bafang Le 23/07/12  
N° 1000889 A

DOIT: chef Fotouni

QTE	DESIGNATIONS	P.U.	P.T.	MONTANT
	transport dix mille francs		10000	10000
<b>Net à payer</b>				10000

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni reprises, ni échangées.

**QUINCAILLERIE ROYALE**  
COMMERCE GENERAL  
MATERIAUX DE CONSTRUCTION  
B.P. 80 Bafang Tél.: 33 48 60 99  
Site Carrefour TCHOUJA

**FACTURE** Bafang Le 25/07/12  
N° 1000374 C

DOIT: C.E.T.I.C. DE FOTOUNI

QTE	DESIGNATION	P.U.	P.T.	MONTANT
50	(voir quantité) bois de			
	transport imp. 5000		250000	
	transport		20000	
<b>Net à payer</b>				270000

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni reprises, ni échangées.



# Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

**Douala :**  
99707334

**Yaoundé :**  
75227459

**Ouest :**  
99935442

**FOTOUNI :**  
77150244

**Diaspora :**  
00436648187498

du 14-06-2012 au 23-06-2012

Etat de l'activité pour le chantier du C.E.T.I.C de Fotouni

Hausie	Louis				
Fongang	Etienne	13j	+ 3000	=	39000
Telton	Seraphin	12j	+ 3000	=	36000
Kangang	J. Robert	11j	+ 2500	=	27500
Fotso	Roni	11j	+ 2000	=	22000
Kengni	Robert	11j	+ 2000	=	22000
WaKalap		6j	+ 2000	=	12000
Kengni	Hulrich	2j	+ 1500	=	3000
Fondjo	Edriss	9j	+ 800	=	7200
Peuzneu	Gabriel	2j	+ 800	=	1600
Siebo	J. Bestin	2j	+ 1500	=	3000
					173300f

fait a fotouni le 23.06.2012 par Etienne fongang.
